

Su carrito de compras – Brightn... | pago de tenencia jalisco en linea | fais.bienestar.gob.mx/pls/fa... | Seguimiento de los Recursos | Artículo 15 | Unidad y Progreso | CONTRATO DGCG 004 2022.pdf | +

**REGISTRO DE AVANZAS INDIVIDUAL DE PROYECTOS**

**Entidad Federativa**: Selecione el estado  
**Municipio**: Selecione el municipio  
**Tipo de recurso**: Selecione el Tipo de Recurso  
**Ciclo de recurso**: Selecione el Ciclo  
**Ramo**: Selecione el Ramo  
**Programa Presupuestario**: Selecione el Programa Presupuestario

**Ir al Inicio** | **Consultar** | **Limpiar** | **Descargar consulta**

Mostrar: 5 proyectos | Buscar: [ ]

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
Proyecto de inversión	JAL220402161399	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA MARÍA ACERO V. - 248021	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa Hidalgo	<a href="#">Registrar Avance</a>
Proyecto de inversión	JAL220402160796	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ENILLOH - 245146	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Hidalgo	<a href="#">Registrar Avance</a>
Proyecto de inversión	JAL220402160439	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CALLE SINALOAH ENTRE CALLE DURANGO Y CARÁNOA - 245152	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aqua y saneamiento	Municipio de Villa Hidalgo	<a href="#">Registrar Avance</a>
Proyecto de inversión	JAL220402162524	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA - 254274	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa Hidalgo	<a href="#">Registrar Avance</a>
Proyecto de inversión	JAL220402163499	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CAC - 259271	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Villa Hidalgo	<a href="#">Registrar Avance</a>

Se han encontrado: 5 proyectos.

Versión 1.0

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

614658200152200...pdf | Mostrar todo

Escribe aquí para buscar | 24°C Soleado | 02:22 p. m. 13/01/2023

Su carrito de compras – Brightn... | pago de tenencia jalisco en linea | fais.bienestar.gob.mx/pls/fa... | Seguimiento de los Recursos | Artículo 15 | Unidad y Progreso | CONTRATO DGCG 004 2022.pdf | +

**SHCP** | **MST** | Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos | Ciclo: 2022 - Período: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

**juanccruz**

**Registros de Avances Individual de Proyectos** | Propósito del Gasto

**Observaciones:** Capturista | [+ agregar](#)

**Observaciones:** Revisión

**Categoría del registro**:  Acción |  Adquisición |  Proyecto de inversión

**Detalles del registro**

<b>Nombre</b> : CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA MARÍA ACERO V. - 248021	<b>Estado Responsable</b> : Jalisco
<b>Tipo de Programa o Proyecto</b> : Proyecto de inversión de Infraestructura Social	<b>Municipio Responsable</b> : Villa Hidalgo
<b>Clasificación del registro</b> : Educación	<b>Institución Ejecutora</b> : Municipio de Villa Hidalgo
<b>Subclasificación del registro</b> : Sin identificar	<b>Población Beneficiada</b> : ¿Es posible identificar población beneficiaria por hombres y mujeres? <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

Periodo de observación: 614658200152200...pdf | Mostrar todo

Escribe aquí para buscar | 24°C Soleado | 02:23 p. m. 13/01/2023

Screenshot of a financial management system interface showing the creation of a new financing source (Fuentes de Financiamiento) and its associated financial advance (Avance Financiero).

**Fuentes de Financiamiento**

Monto Global Aprobado	
\$1,072,500.00	

**Avance Financiero**

Recaudado	
\$1,072,500.00	

**Comprometido**

Devengado	
\$1,072,500.00	

**Ejercido**

Periodo		Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2022 / OCT-DIC	\$0.00	\$0.00	\$1,072,500.00				0%	<a href="#">Editar</a>

**Avances Físicos**

Unidad de Medida		Meta	Meta Modificada
Metros Cuadrados		541.8	541.8

**Promedio del Porcentaje de Avances Físicos** 0.00 %

**Periodo**

Avance	Porcentaje	Acción
0	0.00%	<a href="#">Editar</a>

**Porcentaje Total de la Meta** 0.00 %

**Guardar y Continuar**

**SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD**

**Version 1.0**

**Agregar Fuente de Financiamiento**

**Tipo de Recurso**

Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$1,072,500.00	\$1,072,500.00	<a href="#">Eliminar</a>

**Avance Financiero**

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2022 / OCT-DIC	\$1,072,500.00	\$1,072,500.00	\$1,072,500.00	\$1,072,500.00	\$1,070,500.00	180%	<a href="#">Editar</a>

**Avances Físicos**

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada
Metros Cuadrados	541.8	541.8

**Promedio del Porcentaje de Avances Físicos** 100.00 %

**Periodo**

Avance	Porcentaje	Acción
541.8	100%	<a href="#">Editar</a>

**Porcentaje Total de la Meta** 100.00 %

**Guardar y Continuar**

**SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD**

**Version 1.0**

**Mostrar todo**


**614658200152200...pdf**

**Escribe aquí para buscar**

**24°C Soleado**

**02:24 p.m.**

**13/01/2023**

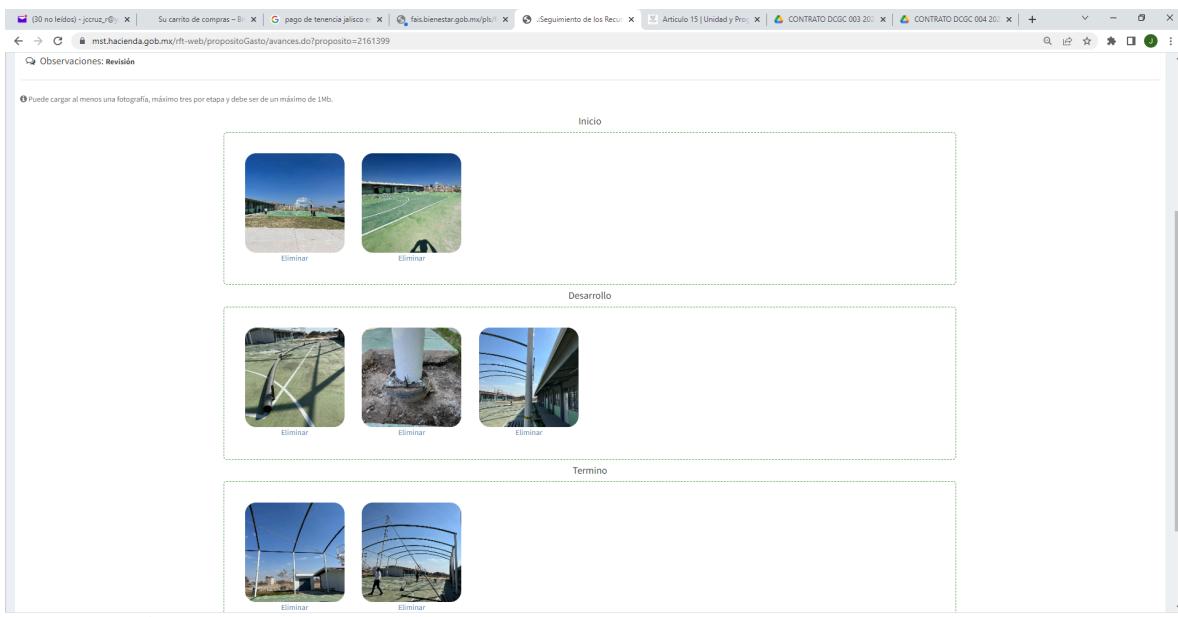

This screenshot displays the 'Registros de Avances Individual de Proyectos' (Individual Project Progress Registrations) page. It includes a summary message, registration details, and navigation buttons.

**Summary Message:** ¡Se han registrado avances! (Advances have been registered!).

**Registration Details:**

- FOLIO DEL REGISTRO: JAL220402161399
- Solicitar Validación ➔ (Request Validation ➔)
- Solicita Cancelación ➔ (Request Cancellation ➔)

**Navigation:**

- CANCELAR (Cancel)
- ANTERIOR (Previous)



Screenshot of a web application for tracking federal resources transferred by the Mexican Treasury (SHCP). The interface shows a timeline of project milestones: Location, Budget, Contract, Document, and Approval.

The main section displays two observation entries:

- Capturista:** LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN (The work is completed and in operation). Status: 11/01/2023 2:43:52 PM. Actions: Eliminar, Agregar.
- Revisión:** Puede cargar al menos una fotografía, máximo tres por etapa y debe ser de un máximo de 1Mb. Status: 11/01/2023 2:43:52 PM. Actions: Eliminar, Agregar.

Below the observations, there are two photographs showing construction progress:

- Inicio:** A view of a large, open construction site with a building under construction.
- Desarrollo:** A view of a completed sports field or track-and-field facility.

The bottom of the screen shows the Windows taskbar with various pinned icons and the system tray indicating 24°C, Soleado, 02:43 p.m., and 13/01/2023.

