LINEAL
CONSTRUCTORA



Alumno En Práctica Profesional
De Constructor Civil
Asesoría En:
Maquinaria / Tránsito / Educación Vial


LISTA DE VERIFICACIÓN DE MAQUINARIA PESADA		
PROYECTO	DIRECCIÓN	COMUNA
EL TOQUI	EL TOQUI #1784	LAS CONDES

MARCA	:		
MODELO	:	REVECIÓN TÉCNICA AL DÍA	SI / NO
AÑO	:		
GRUA	:		

PLANO DETALLADO DE BRAZO DE PLUMA EN AUTOCAD INDICANDO LOS PESOS EN CADA SECCIÓN

LINEAL
CONSTRUCTORA

Alumno En Práctica Profesional
De Constructor Civil
Asesoría En:
Maquinaria / Tránsito / Educación Vial

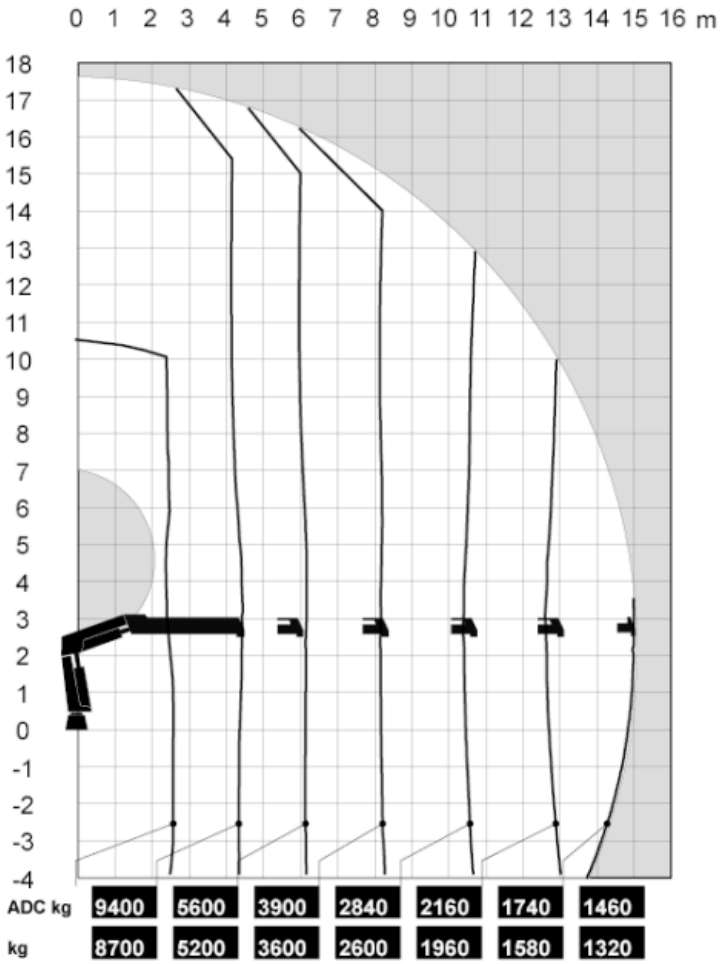


VERIFICACIÓN NEUMATICOS	:
VERIFICACIÓN VISUAL DE LAS LUCES	:
SUENA LA MARCHA ATRÁS	:
VER FECHA DE LAS CADENAS IZAJE	:
COLOCACIÓN DE 4 VIENTOS	SI / NO

LINEAL
CONSTRUCTORA

Alumno En Práctica Profesional
De Constructor Civil
Asesoría En:
Maquinaria / Tránsito / Educación Vial

FECHA	:
NOMBRE DEL APROBADOR	:
FIRMA:	

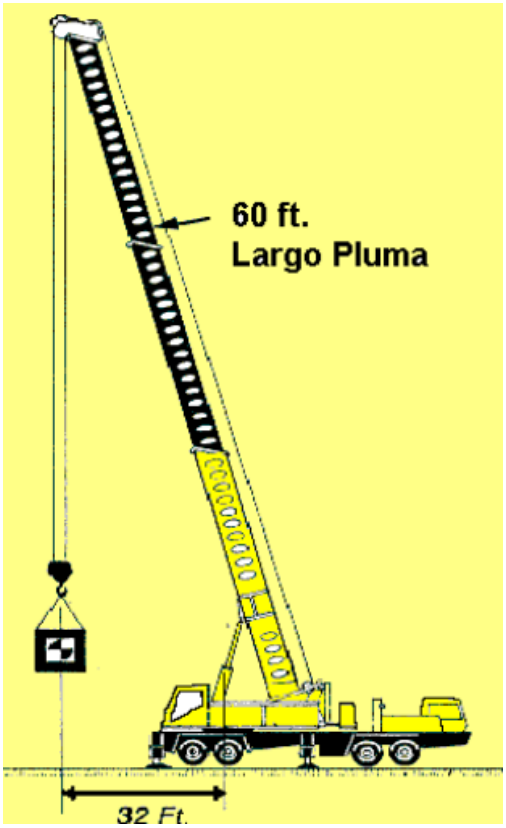

LINEAL
CONSTRUCTORA



Alumno En Práctica Profesional
De Constructor Civil
Asesoría En:
Maquinaria / Tránsito / Educación Vial

Radius in Feet	#0001 or #01 Main Boom Length in Feet									
	36	42	51	60	69	78	87	96	105	114
10	180,000 (67)	121,500 (70.5)	114,000 (74)	107,500 (77)	103,000 (79)					
12	158,000 (63)	120,000 (67.5)	110,000 (71.5)	101,500 (75)	99,300 (77.5)	93,650 (79.5)				
15	136,000 (57.5)	115,000 (63)	102,000 (68)	92,100 (72)	90,250 (75)	84,500 (77)	73,350 (79)			
20	103,500 (47)	99,800 (54.5)	90,050 (61.5)	78,650 (67)	76,850 (70.5)	70,500 (73)	62,750 (75.5)	60,000 (77.5)	56,100 (79)	43,850 (80)
25	82,600 (34)	80,100 (45.5)	73,850 (55)	68,900 (61.5)	66,250 (66)	60,150 (69.5)	54,250 (72)	52,250 (74.5)	48,650 (76)	40,950 (77.5)
30		65,650 (34)	61,400 (47.5)	57,650 (55.5)	55,400 (61)	52,400 (65)	46,900 (68.5)	44,900 (71)	42,900 (73)	35,100 (75)
(35)		51,250 (16.5)	51,250 (38.5)	49,700 (49.5)	46,600 (56)	44,950 (61)	41,150 (65)	39,200 (68)	37,300 (70)	30,400 (72)
40	See Note 16		40,250 (28.5)	40,250 (42.5)	40,250 (51)	38,550 (56.5)	36,550 (61)	34,650 (64.5)	32,800 (67)	26,650 (69.5)
45				32,600 (34.5)	32,600 (45)	32,600 (52)	32,400 (57)	30,950 (61)	29,150 (64)	23,600 (66.5)
50				26,950 (24)	26,950 (38.5)	26,950 (47)	26,950 (53)	26,950 (57.5)	26,150 (61)	21,350 (63.5)

LINEAL
CONSTRUCTORA

Alumno En Práctica Profesional
De Constructor Civil
Asesoría En:
Maquinaria / Tránsito / Educación Vial

