ID	Risco	Categoria	Consequência	Resposta	Ação	Sprint 01	Sprint 02	Sprint 03	Sprint 04	Sprint 05	Sprint 06	Sprint 07	Sprint 08	Sprint 09	Sprint 10	Sprint 11
1	Falta de conhecimento da equipe com as tecnologias	Técnico	Time travado no desenvolvimento das funcionalidades	Mitigar	Treinamentos e troca de conhecimento entre membr	25	20	20	20	15	10	10	10	10	10	10
2	Falta de conhecimento da equipe com o código fonte do projeto	Técnico	Atraso no desenvolvimento das funcionalidades	Mitigar	Começar a mexer no código co antecedência e estudar o que já	25	25	20	20	20	15	10	15	10	10	10
3	Desistência de membros da equipe	Externo	Ausência de pessoas para realizar o trabalho inicialmente pensado para uma quantidade maior de pessoas	Prevenir	Comunicação entre membros e motivação	15	20	15	10	4	4	4	4	4	4	0
4	Retrabalho	Organizacional	Perda de tempo refazendo o que já foi feito e atraso no desenvolvimento de novas funcionalidades	Prevenir	Comunicação entre membros para saber o que está sendo feito por outros pareamentos	1	4	16	16	16	16	16	16	16	25	25
5	Falta ou falha de equipamentos	Externo	Pausa no desenvolvimento e atraso nas entregas	Aceitar	Utilizar equipamentos melhore	25	25	25	25	25	15	5	5	5	15	15
6	Dificuldade em configurar o ambiente	Técnico	Atraso no inicio do desenvolvimento	Mitigar	Pareamento entre MDS e EPS para facilitar a subida de ambie	9	3	3	3	2	0	0	0	0	0	0
7	Equipe Schedula nao entregar API a tempo de ser consumida	Externo	Atraso na entrega das funcionalidades de consumo de API	Transferir	Comunicação entre Alectrion e Schedula	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Má priorização das tarefas	Organizacional	Sobrecarga de trabalho e atraso nas entregas	Mitigar	Aprender com os erros das sprints anteriores	25	25	20	12	12	12	8	8	12	16	8
9	Comunicação ineficiente entre os membros da equipe	Planejamento	Falta de alinhamento no time	Prevenir	Fazer dailies presenciais e retrospectiva com camera aberta, além de tentar falar mais no discord	15	20	20	20	20	15	10	10	15	20	10
10	Comunicacao ineficiente entre mds e eps	Planejamento	Falta de alinhamento no time	Prevenir	Dinamicas para equipe se conhecer e conversa intermedi	12	20	15	15	20	15	10	8	8	8	8
11	Falta de compatibilidade entre horários dos membros	Externo	Ausência de troca de conhecimento e atrasos nas entregas	Aceitar	Heatmap para definir horários c	15	16	16	12	16	12	12	9	9	12	9
12	Reuniões prolongadas e cansativas	Organizacional	Desfoque e desânimo do time	Mitigar	Definir slots de tempo máximo para cada reunião		12	8	6	6	6	9	6	6	6	6
13	Falta de foco durante as reuniões	Organizacional	Dificuldade em entender o que deve ser feito	Mitigar	Definir tópicos de assuntos para as reuniões		6	3	3	3	3	3	3	3	3	3
14	Internet ruim	Externo	Desenvolvimento mais lento	Prevenir	Buscar locais com internet melhor		12	16	25	8	12	8	8	4	4	4
15	Pareamentos prolongados e cansativos	Organizacional	Desanimo do time	Mitigar	Definir dia e horário para pareamentos			25	20	20	15	10	10	15	15	15
16	Risco de mudança de cronograma	Organizacional	Mudanças no planejamento	Aceitar	Melhorar a comunicação da equipe para compreender melhor mudanças de					25	25	20	20	16	8	4
17	Risco de trabalho não concluído	Organizacional	Desânimo e sobrecarga do time, falta de	Prevenir	Pela velocidade de entreqa do time, planejar pontos que equipe consegue en					20	20	20	20	15	15	10
18	POs nao popularam API	Externo	Integração ruim	Prevenir	Comunicar com POs e schedula sobre a necessidade					12	20	20	15	10	5	0
19	Provas de outras matérias	Externo	Sobrecarga e cansaço do time	Mitigar	Identificar pessoas com muitas demandas e redistribuição de trabalho					0	20	20	25	20	25	25



			Sprint 1		Sprint 2		Sprint 3		Sprint 4		Sprint 5		Sprint 6		Sprint 7		Sprint 8		Sprint 9		Sprint 10		Sprint 11	
ID Risco	Identificacao risco	Risco	P	I	P	I	P	I	P	I	P	I	P	I	P	I	P	I	P	I	P	I	P	I
	Sprint 1	Falta de conhecimento da equipe com as tecnologias	5	5	4	5	4	5	4	5	3	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5
	Sprint 1	Falta de conhecimento da equipe com o código fonte do projeto	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	3	5	2	5	3	5	2	5	2	5	2	5
	Sprint 1	Desistência de membros da equipe	3	5	4	5	3	5	2	5	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	0	4
	Sprint 1	Retrabalho	1	1	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
	Sprint 1	Falta ou falha de equipamentos	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	1	5	1	5	1	5	3	5	3	5
	Sprint 1	Dificuldade em configurar o ambiente	3	3	1	3	1	3	1	3	1	2	0	2	0	2	0	1	0	1	0	1	0	1
	Sprint 1	Equipe Schedula nao entregar API a tempo de ser consumida	3	0	3	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sprint 1	Má priorização das tarefas	5	5	5	5	4	5	3	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	4	4	2	4
	Sprint 1	Comunicação ineficiente entre os membros da equipe	3	5	4	5	4	5	4	5	4	5	3	5	2	5	2	5	3	5	4	5	2	5
	Sprint 1	Comunicacao ineficiente entre mds e eps	4	5	4	5	3	5	3	5	4	5	3	5	2	5	2	4	2	4	2	4	2	4
	Sprint 1	Falta de compatibilidade entre horários dos membros	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3
	Sprint 1	Reuniões prolongadas e cansativas	4	4	3	4	2	4	2	3	2	3	2	3	3	3	2	3	2	3	2	3	2	3
	Sprint 1	Falta de foco durante as reuniões	3	5	2	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
	Sprint 2	Internet ruim			3	4	4	4	5	5	2	4	3	4	2	4	2	4	1	4	1	4	1	4
	Sprint 3	Pareamentos prolongados e cansativos					5	5	4	5	4	5	3	5	2	5	2	5	3	5	3	5	3	5
	Sprint 4	Risco de mudança de cronograma									5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	2	4	1	4
	Sprint 4	Risco de trabalho não concluído									4	5	4	5	4	5	4	5	3	5	3	5	2	5
	Sprint 4	POs nao popularam API									3	4	4	5	4	5	3	5	2	5	1	5	0	5
	Sprint 5	Provas de outras matérias											4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5
	P	Probabilidade																						
	I	Impacto																						

Sprint	Total
Sprint 1	167
Sprint 2	208
Sprint 3	228
Sprint 4	187
Sprint 5	172
Sprint 6	140
Sprint 7	105
Sprint 8	102
Sprint 9	107
Sprint 10	113
Sprint 11	124

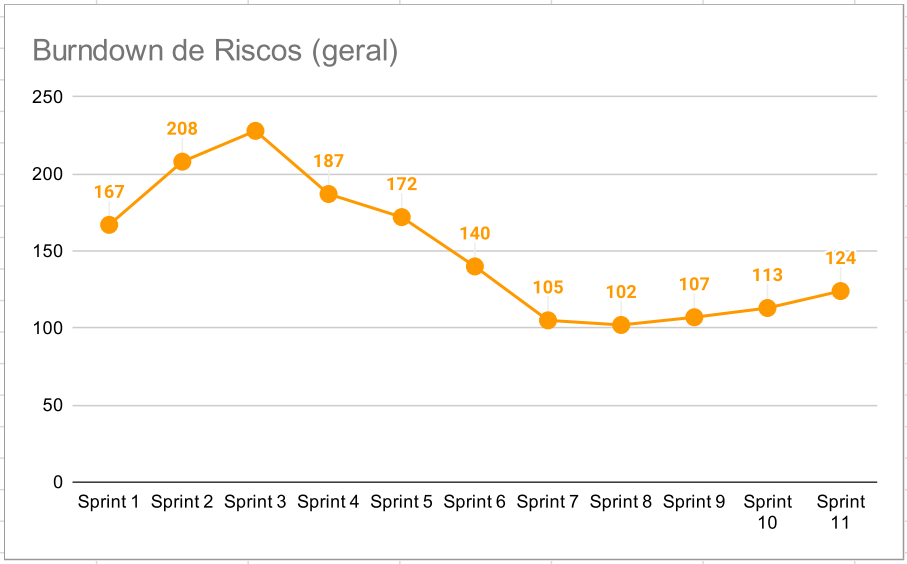

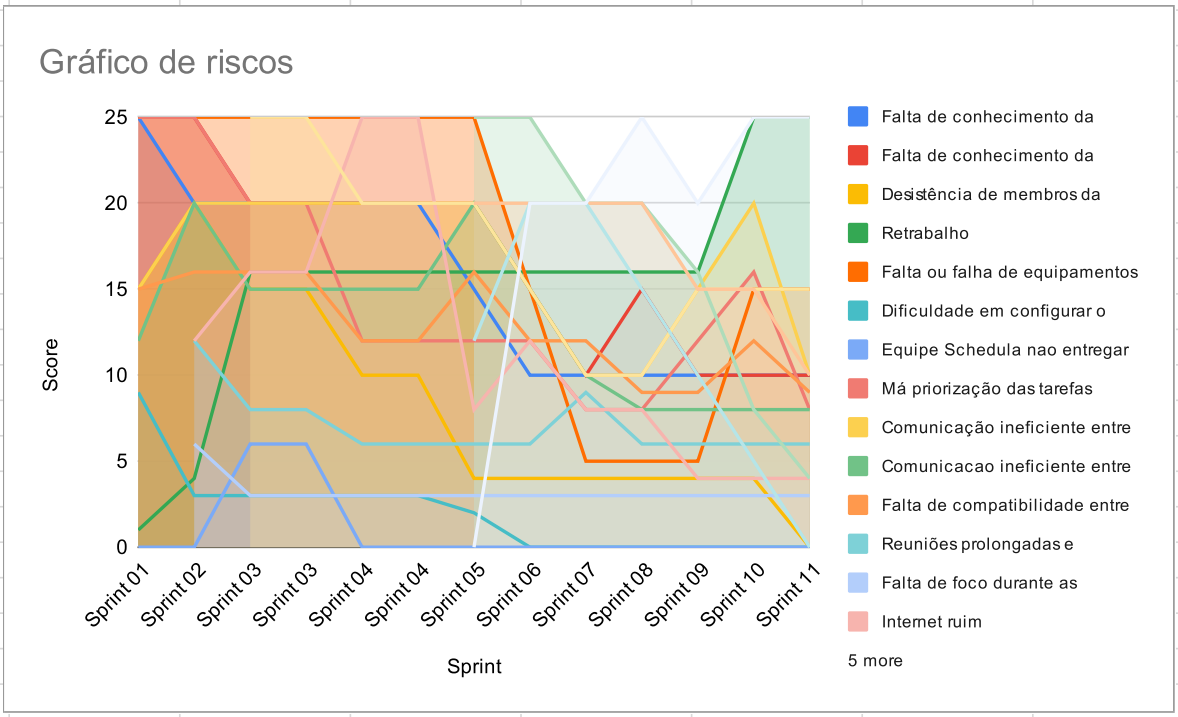
Gráfico de riscos
Score
25
20
15
10
5
0
Sprint 01
Sprint 02
Sprint 03
Sprint 03
Sprint 04
Sprint 04
Sprint 05
Sprint 06
Sprint 07
Sprint 08
Sprint 09
Sprint 10
Sprint 11
Sprint
Falta de conhecimento da
Falta de conhecimento da
Desistência de membros da
Retrabalho
Falta ou falha de equipamentos
Dificuldade em configurar o
Equipe Schedula nao entregar
Má priorização das tarefas
Comunicação ineficiente entre
Comunicacao ineficiente entre
Falta de compatibilidade entre
Reuniões prolongadas e
Falta de foco durante as
Internet ruim
5 more
