Nur Lesezugriff

Sie können dieses Dokument nur **ansehen**. Wenn Sie Änderungen vornehmen möchten, fordern Sie beim Eigentümer eine Berechtigung zum Bearbeiten an.

BEARBEITUNGSZUGRIFF ANFORDERN

So verwenden Sie diese Vorlage:
Diese Vorlage ist nur zur Ansicht und kann nicht bearbeitet werden.

Erstellen Sie Ihre eigene Kopie,
um die Vorlage zu bearbeiten.

Klicken Sie Im Menü auf
DATEI > KOPIE ERSTELLEN ...

Datei | Bearbeiten | Ansehen | Einfüge
Freigeben...
Neu ›
Öffnen... ⌘O
Kopie erstellen...
Herunterladen als ›

GANTT-DIAGRAMM SCRUM-PROJEKTMANAGEMENT

smartsheet KOSTENLOS TESTEN

GANTT-DIAGRAMM UND BURNDOWN

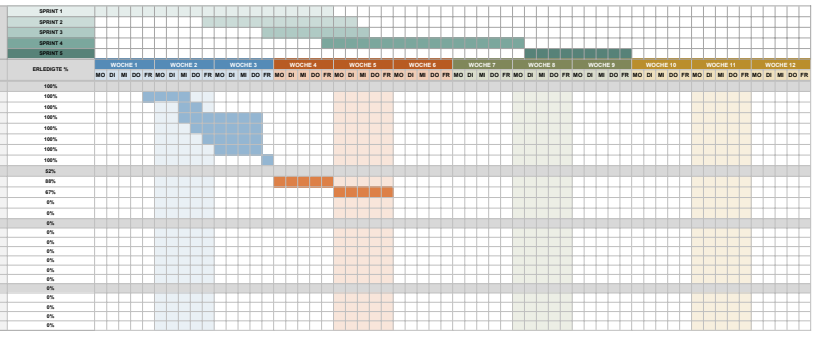

PROJEKT-STRUKTURPLAN	AUFGABENNAME	INHABER D. AUFGABE	ARBEITSAUFWAND IN STD.			SPRINT	START-DATUM	FÄLLIG AM	DAUER	ERLEDIGTE %
			GESCHÄTZT	GELEISTET	VERBLEIBEND					
1	Projektkonzept und -initiierung		309	309	0					100%
1.1	Projektauftrag	Leon W	40	40	0		12-Mar-2017	15-Mar-2017	4	100%
1.1.1	Revisionen Projektauftrag	Juliane R	25	25	0		15-Mar-2017	16-Mar-2017	2	100%
1.2	Recherchen	Peter S	100	100	0		15-Mar-2017	21-Mar-2017	7	100%
1.3	Prognosen	Stefan L	60	60	0		16-Mar-2017	22-Mar-2017	7	100%
1.4	Stakeholder	Anton W	40	40	0		17-Mar-2017	22-Mar-2017	6	100%
1.5	Richtlinien	Malik M	32	32	0		18-Mar-2017	22-Mar-2017	5	100%
1.6	Projektinitiierung	Malik M	12	12	0		22-Mar-2017	23-Mar-2017	1	100%
2	Projektbestimmung und -planung		210	110	100					52%
2.1	Festlegung Umfang und Ziel	Stefan L	80	70	10		24-Mar-2017	28-Mar-2017	5	88%
2.2	Budget	Allen W	60	40	20		29-Mar-2017	3-Apr-2017	5	67%
2.3	Kommunikationsplanung	Malik M	40	0	40				1	0%
2.4	Risikomanagement	Malik M	30	0	30				1	0%
3	Projekt-Launch und Durchführung		66	0	66					0%
3.1	Status und Nachverfolgung	Peter S	20	0	20				1	0%
3.2	KPIs	Leon W	20	0	20				1	0%
3.2.1	Monitoring	Juliane R	8	0	8				1	0%
3.2.2	Prognosen	Juliane R	12	0	12				1	0%
3.3	Projektaktualisierungen	Peter S	4	0	4				1	0%
3.3.1	Diagrammaktualisierungen	Malik M	2	0	2				1	0%
4	Projekt-Performance/Monitoring		32	0	32					0%
4.1	Projektziele	Stefan L	8	0	8				1	0%
4.2	Qualitätsanforderungen	Anton W	12	0	12				1	0%
4.3	Aufwand- und Kosten-Tracking	Malik M	8	0	8				1	0%
4.4	Projekt-Performance	Malik M	4	0	4				1	0%

BURNDOWN-DATEN

	GESCHÄTZT	GELEISTET	VERBLEIBEND	TAGE	GESCH./TAGE
STUNDEN INSG.	617	419	198	60	10.28333333

* Anzahl d. Tage eingeben

Anzahl der geleisteten Std. pro Tag eingeben ---->

TAG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	STD. INSG.
GEPLANT	617	602	589	569	549	529	509	489	469	449	429	409	389	369	349	329	309	289	269	249	229	209	189	169	149	129	109	89	69	49	29	9	-11	-31	-51	-71	-91	-111	-131	-151	-171	-191	-211	-231	-251	-271	-291	-311	-331	-351	-371	-391	-411	-431	-451	-471	-491	-511	-531	
GESCHÄTZT	617	602	589	569	549	529	509	489	469	449	429	409	389	369	349	329	309	289	269	249	229	209	189	169	149	129	109	89	69	49	29	9	-11	-31	-51	-71	-91	-111	-131	-151	-171	-191	-211	-231	-251	-271	-291	-311	-331	-351	-371	-391	-411	-431	-451	-471	-491	-511	-531	15968
GELEISTETE STD.	8	20	30	40	20	11	16	42	45	20	10	16	24	48	20	4	5	4	8	8	5	5	5	3	2																																					419
VERBLEIBENDE STD.	609	589	559	519	499	488	472	430	385	365	355	339	315	267	247	243	238	234	226	218	213	208	203	200	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	15549

BURNDOWN DIAGRAMM

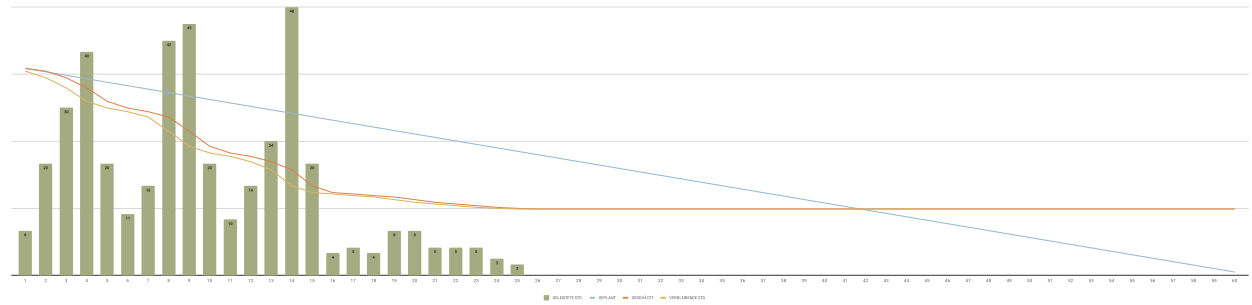

HIER KLICKEN, UM GANTT-DIAGRAMME MIT SMARTSHEET VORLAGEN ZU ERSTELLEN

GANTT-DIAGRAMM SCRUM PROJEKTMANAGEMENT

smartsheet

GANTT-DIAGRAMM UND BURNDOWN

SPRINTS	
SPRINT 1	
SPRINT 2	
SPRINT 3	
SPRINT 4	
SPRINT 5	

PROJEKT-STRUKTURPLAN	AUFGABE	INHABER D. AUFGABE	ARBEITSAUFWAND IN STD.			SPRINT	START DATUM	FÄLLIG AM	DAUER	ERLEDIGTE %
			GESCHÄTZT	GELEISTET	VERBLEIBEND					
1			0	0	0					#DIV/0!
1.1					0				1	#DIV/0!
1.1.1					0				1	#DIV/0!
1.2					0				1	#DIV/0!
1.3					0				1	#DIV/0!
1.4					0				1	#DIV/0!
1.5					0				1	#DIV/0!
1.6					0				1	#DIV/0!
2			0	0	0					#DIV/0!
2.1					0				1	#DIV/0!
2.2					0				1	#DIV/0!
2.3					0				1	#DIV/0!
2.4					0				1	#DIV/0!
3			0	0	0					#DIV/0!
3.1					0				1	#DIV/0!
3.2					0				1	#DIV/0!
3.2.1					0				1	#DIV/0!
3.2.2					0				1	#DIV/0!
3.3					0				1	#DIV/0!
3.3.1					0				1	#DIV/0!
4			0	0	0					#DIV/0!
4.1					0				1	#DIV/0!
4.2					0				1	#DIV/0!
4.3					0				1	#DIV/0!
4.4					0				1	#DIV/0!

	WOCHE 1	WOCHE 2	WOCHE 3	WOCHE 4	WOCHE 5	WOCHE 6	WOCHE 7	WOCHE 8	WOCHE 9	WOCHE 10	WOCHE 11	WOCHE 12
	MO DI MI DO FR	MO DI MI DO FR	MO DI MI DO FR	MO DI MI DO FR	MO DI MI DO FR	MO DI MI DO FR	MO DI MI DO FR	MO DI MI DO FR	MO DI MI DO FR	MO DI MI DO FR	MO DI MI DO FR	MO DI MI DO FR

BURNDOWN DATEN

	GESCHÄTZT	GELEISTET	VERBLEIBEND	TAGE	GESCH./TAGE
STD. INSG.	0	0	0	60	0

^ Anzahl d. Tage eingeben

Anzahl der geleisteten Std. pro Tag eingeben ---->

TAG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
GEPLANT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESCHÄTZT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GELEISTETE STD.																																																														
VERBLEIBENDE STD.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

STD. INSG.

0
0
0

BURNDOWN-DIAGRAMM



GANTT-DIAGRAMM SCRUM PROJEKTMANAGEMENT

RELEASE-BACKLOG

PRIORITÄT	SPRINT	FUNKTION	AUFGABE	AUFGABENBESCHREIBUNG	INHABER D. AUFGABE	ARBEITSAUFWAND IN STD.	STATUS	NOTIZEN
						1	Nicht begonnen	
						2	In Arbeit	
						8	Vollständig	
						8	Nicht begonnen	
						4		
						80		
						16		
						8		
						4		
						2		
						24		
						40		
						8		

STATUSSCHLÜSSEL
Nicht begonnen
In Arbeit
Vollständig

ARBEITSAUFWAND IN STD.
1
2
4
8
16
24
40
80

GANTT-DIAGRAMM SCRUM PROJEKTMANAGEMENT

NUTZER-STORIES oder AUFGABEN

AUFGABE	AUFGABENBESCHREIBUNG	HINZUGEFÜGT VON	HINZUGEFÜGT AM
